

# รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน




## สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน	7
แยกตามหน่วยงาน	
- กลุ่มตรวจสอบภายใน	8
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	10
- สำนักบริหารกลาง	13
- กองนโยบายและแผนพลังงาน	20
- ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน	24
- สำนักนโยบายไฟฟ้า	31
- สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	36
- สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	39
- กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ผชช.วย.)	44
ภาคผนวก	46
- แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2560	47

## บทสรุป


1. ผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน สรุปได้ดังนี้

- มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 91 โครงการ เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62 และมีโครงการที่ยกเลิก จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 ดังภาพที่ 1

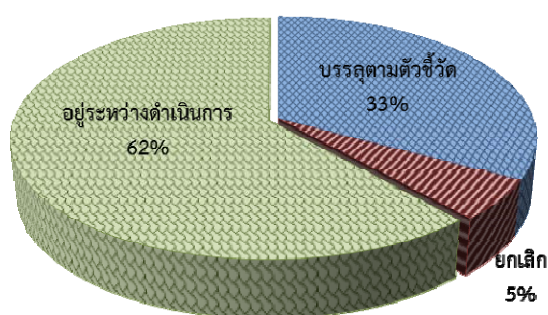

ภาพที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

- สัดส่วนของการดำเนินโครงการตามแผนฯ พบว่า สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 83.33 ในขณะที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักบริหารกลาง ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน กองนโยบายและแผนพลังงาน สำนักนโยบายไฟฟ้า กลุ่มตรวจสอบภายใน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ผชช.วย.) และสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 80.00, 77.50, 74.71, 66.67, 62.22, 60.00, 50.00 และ 38.66 ตามลำดับ ดังภาพที่ 2

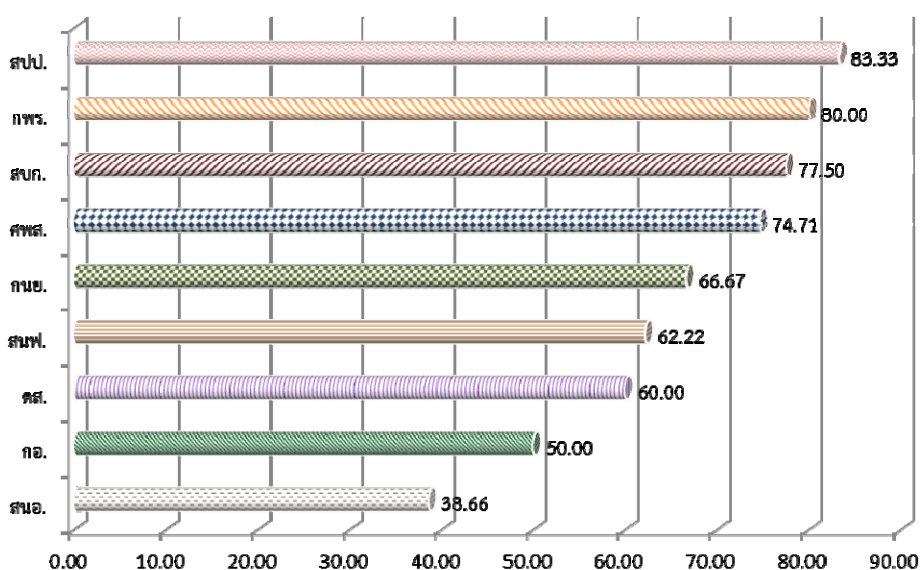

ภาพที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแยกตามสำนัก

2. ผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน สรุปได้ดังนี้

2.1. กลุ่มตรวจสอบภายใน โครงการที่อยู่ในแผนฯ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด ร้อยละ 60 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง	60	

2.2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โครงการที่อยู่ในแผนฯ 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. ปรับเปลี่ยนการประเมินส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	60	
2. การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.	100	
3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สนพ. (PMQA)	-	ยกเลิก
4. มาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	80	
5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงาน	80	

2.3. สำนักบริหารกลาง โครงการที่อยู่ในแผนฯ 22 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 8 โครงการ และยกเลิก 2 โครงการ เนื่องจากมีนโยบายให้นำงบประมาณไปจัดร่วมกับโครงการอบรมอื่น คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด ร้อยละ 77.50 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสภายใน สนพ.	60	
2. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3. การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	50	
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	100	
5. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	100	
6. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	100	
7. การพัฒนาระบบตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	100	
8. โครงการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สนพ.	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
9. โครงการวางแผนและออกแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงาน	80	
10. โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารนโยบายพลังงาน	100	
11. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	100	
12. การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)	100	
13. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	-	ยกเลิก
14. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร "English Training Course"	60	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
2017"		
15. การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย	100	
16. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	100	
17. การฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	-	ยกเลิก
18. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	40	
19. การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคหญิงชาย	60	
20. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	
21. การปิดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	100	
22. การควบคุม กำกับ ดูแล บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	

2.4. กองนโยบายและแผนพลังงาน โครงการที่อยู่ในแผนฯ 12 โครงการ ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว 3 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จของตัวชี้วัด ร้อยละ 66.67 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	60	
2. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านนโยบายพลังงาน	80	
3. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานและมาตรการที่อนุมัติโดย กพข.	40	
4. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ สนพ.	80	
5. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สนพ.	100	
6. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	60	
7. การดำเนินงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	100	
8. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สนพ.	80	
9. การจัดทำรายงานประจำปีของ สนพ.	80	
10. การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำงบประมาณ	100	
11. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12. โครงการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560	20	

2.5. ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน โครงการที่อยู่ในแผนฯ 17 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 12 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จของตัวชี้วัด ร้อยละ 74.71 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก เปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้านพลังงานของไทยกับต่างประเทศ	100	
2. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	50	
3. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	80	
4. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ	60	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
ASEAN, APEC และ IEA		
5. การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ	60	
6. การจัดทำรายงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานรายสาขาเศรษฐกิจ	80	
7. การจัดทำหนังสือรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย	60	
8. การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	60	
9. การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	60	
10. การศึกษา ติดตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100	
11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 1 (ต่อเนื่องปี2559)	100	
12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ (ต่อเนื่องปี 2559)	60	
13. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทำค่าพยากรณ์ไฟฟ้า (Load Forecast) รายภาค	60	
14. การปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	100	
15. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ สนพ.	100	
16. การจัดการความรู้ในองค์กร (EPPO KM)	60	
17. การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	80	

**2.6. สำนักนโยบายไฟฟ้า** โครงการที่อยู่ในแผนฯ 11 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ 7 โครงการ และยกเลิก 2 โครงการ เนื่องจากมีนโยบายให้บางงบประมาณไปจัดร่วมกับโครงการอบรมอื่น คิดเป็นความสำเร็จของตัวชี้วัด ร้อยละ 62.22 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	60	
2. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	0	
3. การเสนอแนะนโยบาย ศึกษา ติดตามและพิจารณาการรับซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านตามบันทึกข้อตกลง	100	
4. การขยายระบบโครงข่ายและแผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้า	60	
5. โครงการศึกษานโยบายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2	40	
6. โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดการจัดหาไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2559)	60	
7. โครงการแผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	80	
8. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทบทวนต้นทุนราคาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff	80	
9. การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทบทวนแผนรองรับสถานะ	-	ยกเลิก

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
วิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า		
10 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดหาพลังงานไฟฟ้า	-	ยกเลิก
11. การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	80	ดำเนินการแล้วเสร็จ

2.7. สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โครงการที่อยู่ในแผนฯ 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 83.33 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. การทบทวนและจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ	100	
2. โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อเนื่องปี 2559)	80	
3. การจัดทำแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโครงสร้างก๊าซธรรมชาติ	80	
4. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....	60	
5. การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทดแทน : ไบโอดีเซล (B100)	80	
6. การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	100	

2.8. สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โครงการที่อยู่ในแผนฯ 15 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 38.66 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	60	
2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	40	
3. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	80	
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน	100	
5. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charing Station) ระยะที่ 2	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7. โครงการสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	40	
9. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	80	
10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน	100	
11. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13. โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครบรอบ 25 ปี	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	20	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ	0	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

2.9. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ผชช.วย.) โครงการที่อยู่ในแผนฯ 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ 50 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	20	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	80	



รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
รอบ 9 เดือน  
แยกตามหน่วยงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
5.2	57 การประกันคุณภาพ การตรวจสอบ ภายในด้วยตนเอง	พ.ย.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ในการประเมินการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน	ระดับ 5	ระดับ 3 สรุปผลการ ประเมินตนเองใน ภาพรวมของ หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน และจัดทำ รายงานผลการ ประเมินตนเองและ แผนพัฒนาการ ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการตาม แผนการพัฒนาและ ปรับปรุงฯ งาน ตรวจสอบภายใน	-	-	

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
5.1	47 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	ระดับ 5	ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จร้อยละ 80	25 พ.ค. 60 จัดส่งสรุปข้อคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของ สนพ. พร้อมรายละเอียดและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในวันที่ 18 ก.ค.60			
	48 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จในการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการประจำปี	ระดับ 5	ระดับ 5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	แจ้งเวียนประกาศมาตรฐานกระบวนการของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2560 ให้กับบุคลากรทราบเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.60			
5.2	49 การดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สนพ.	ยกเลิก					ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สนพ.	ระดับ 5					ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงาน ก.พ.ร. เปลี่ยนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ในองค์ประกอบที่ 4 และ 5 แล้ว

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ได้รับ		ใช้จริง
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
52	มาตรฐานการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามมาตรการ ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ	ระดับ 5	ระดับ 4 ติดตามและ รายงานความก้าวหน้า ค่าเป้าหมายรอบที่ 1 (1 ต.ค.59 - 20 ก.พ.60)	อยู่ระหว่างการติดตามและ รายงานความก้าวหน้าค่า เป้าหมายรอบที่ 2			
53	การถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับองค์กรลงสู่ระดับ หน่วยงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดระดับองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงาน	ระดับ 5	ระดับ 4 ติดตามและ รายงานความก้าวหน้า รอบ 6เดือน	อยู่ระหว่างการติดตาม ความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน			จัดพิธีลงนามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.60

# สำนักบริหารกลาง

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  
สำนักบริหารกลาง

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
5.2	58 โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันการทุจริต และสร้าง ความโปร่งใสภายใน ส.นพ.	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามมาตรการการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ โปร่งใส	ระดับ 5	ระดับ 3 ดำเนินการสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ร้อยละ 50	อยู่ระหว่างการดำเนิน กิจกรรมตามแผน ซึ่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แล้ว 17 กิจกรรม จาก กิจกรรมตามแผน 19 กิจกรรม	20,000		
	59 โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ความพึงพอใจของ ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ภายใน องค์กร	ร้อยละ 70		ดำเนินการจัด กิจกรรมที่ 1 การ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 60 และอยู่ ระหว่างการจัด เตรียมการจัดกิจกรรม ที่ 2 ในต่างจังหวัด	101,600	26,260	เปลี่ยนจาก "เทคนิคการเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน" เป็น โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
60	การจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบ โสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานโยบาย และแผนพลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		จำนวนรายงานการ ตรวจเช็คระบบห้อง ประชุมภายใน สนพ.	3 ครั้ง	ระดับ 3 จำนวนรายงานการ ตรวจเช็คระบบห้องประชุม ปียสวัสดีชั้น 6 ชั้น 2 และชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	83,674	62,755.50		
							ร้อยละของความพึง พอใจของบุคลากร ใน สนพ. ที่ใช้ บริการระบบ โสตทัศนูปกรณ์	ร้อยละ 70	อยู่ระหว่างการ รวบรวมแบบสอบถาม ความพึงพอใจบุคลากร ใน สนพ.				
61	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพิ่ม สมรรถนะเจ้าหน้าที่ เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่ พัสดุเงินกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ร้อยละความสำเร็จ ของการเพิ่ม สมรรถนะเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน	ร้อยละ 76	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สามารถเพิ่มสมรรถนะ คิดเป็น ร้อยละ 84.56	90,000	87,700.89		
62	การจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลิตของ สนพ.	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ ต้นทุนต่อหน่วย ผลิต	ระดับ 5	ระดับ 5 รายงานแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับความ เห็นชอบจากหัวหน้าส่วน ราชการ				
63	การจัดทำรายงาน การเงินประจำปีของ สนพ.	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ รายงานการเงิน ประจำปี	ระดับ 5	ระดับ 5 ส่งรายงานการเงิน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
	64 การพัฒนาระบบ ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคา e-bidding	ระดับ 5 ร้อยละ 100 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุฯ ควบถ้วน จำนวน 4 เรื่อง					
	65 โครงการสำรวจ ความต้องการ ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการทั้ง ภายในและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของ สนพ.	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ร้อยละความพึง พอใจของบุคลากร ใน สนพ. ตาม แผนการดำเนินงาน โครงการ	ร้อยละ 75	อยู่ระหว่างการ เตรียมการประชุม คณะทำงานสำรวจ ทัศนคติเจ้าหน้าที่ สนพ. ต่อการบริหาร องค์กรเพื่อพิจารณา ร่างแบบสำรวจและ แผนปฏิบัติงานสำรวจ ทัศนคติเจ้าหน้าที่ สนพ. ต่อการบริหาร องค์กร				
	66 โครงการวางแผน และออกแบบการ บริหารจัดการเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์ พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการดำเนิน โครงการสร้าง ภาพลักษณ์ของ สนพ.	ระดับ 5	ระดับ 4 ดำเนินการ แผนปฏิบัติการในการวาง ระบบสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี ต่อ สนพ.	5,000,000	1,400,000		
	67 โครงการผลิตและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วารสารนโยบาย พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		จำนวนหน่วยงาน หลัก/ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านพลังงานที่ได้รับ รู้การดำเนินงานของ สนพ.	50 หน่วยงาน	ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน/ปี	จัดส่งและเผยแพร่ วารสารนโยบาย พลังงานฉบับที่ 116 (ต.ค.-พ.ย.59) และ ฉบับที่ 117 (ธ.ค.59- ม.ค.60)	1,500,000		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
5.3	69 โครงการระบบ ข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ในการดำเนิน โครงการระบบ ข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับ 5	ระดับ 5 ประกาศผลการ พิจารณาคัดเลือกฯ ของ สนพ. และประสานแจ้งผล การคัดเลือกกับสำนักงาน ก.พ.				
	70 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS)	ต.ค.59-ก.ย.60	x				จำนวนกิจกรรม ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ นำฐานข้อมูลจาก โปรแกรม DPIS มาใช้	5 กิจกรรม/ปี	ระดับ 5 อย่างน้อย 5 กิจกรรม				
5.4	72 การพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน	ยกเลิก					ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินจัด โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	ระดับ 5		16,000		ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีงบประมาณใน การจัดฝึกอบรม	
	73 โครงการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "English Traning Course 2017"	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ในการดำเนิน โครงการฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "English Traning Course 2017"	ระดับ 5	ระดับ 3 จัดทำ TOR และขอ อนุมัติในการดำเนินการจัด จ้างเหมาฝึกอบรม ภาษาอังกฤษ	300,000			

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
74	การอบรม ภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมาย	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการ จัดส่งนิตการเข้ารับ การอบรม	ระดับ 5	ระดับ 5 นักกฎหมายเข้ารับ การฝึกอบรมและผ่านการ อบรมได้รับวุฒิบัตร		50,000	28,000	
81	การพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุ	ต.ค.59-ก.ย.60			x		จำนวนเรื่องที่ได้รับ การอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุ	9 เรื่อง	บุคลากรได้รับการอบรม/ สัมมนา ด้านการเงิน การ บัญชี หรือการพัสดุ จำนวน 9 เรื่อง		200,000	96,000	
82	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ	ยกเลิก					ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ โครงการฝึกซ้อม ดับเพลิงและ ฝึกซ้อมหนีไฟ	ระดับ 5			10,000		ขอยกเลิก เนื่องจากไม่มี งบประมาณในการ จัดฝึกอบรม
83	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ในการดำเนิน โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	ระดับ 5	ระดับ 2 ขออนุมัติในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	อยู่ระหว่างอนุมัติ โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาสัตนเขาสอนอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	30,000		
84	การเสริมสร้างความ ตระหนักรู้ด้าน คุ้มครองสิทธิ มนุษยชนและความ เสมอภาคหญิงชาย	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริม ความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย และสิทธิมนุษยชน	ระดับ 5	ระดับ 3 แผนแม่บทการ ส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายและสิทธิ มนุษยชนผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการกำกับดูแล งานด้านความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย	อยู่ระหว่างการ เตรียมการจัดประชุม เพื่อพิจารณาร่าง แม่บทการส่งเสริม ความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายและ สิทธิมนุษยชน	20,000		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
5.5	85 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค.59-ก.ย.61			x		ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับ 5	ระดับ 5 ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60		640,000		
	90 การปิดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60	x		x		ระดับความสำเร็จในการปิดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 5 ปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 112 โครงการ				
	91 การควบคุม กำกับดูแล บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับ 5	ระดับ 5 การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ				

8,061,274 1,700,716

# กอนงนโยบายและแผนปล้งงาน

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  
 กองนโยบายและแผนพลังงาน

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
1.1	9 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN, และ APEC	ต.ค.59-ก.ย.60			x		จำนวนรายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	2 รายงาน	ระดับ 3 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC จำนวน 1 รายงาน		470,000	23,030.72	
1.5	17 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านนโยบายพลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงานด้านนโยบายพลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 4 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ ต่อผู้บริหาร สทพ.				
	18 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพข.	ธ.ค.59-ธ.ค.60			x		ระดับความสำเร็จของโครงการและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 2 ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ กพข. และ กบง. ที่ได้รับอนุมัติในช่วงปี 2556 – 2559		4,470,000	2,225,000	
5.2	50 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สทพ.	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สทพ.	ระดับ 5	ระดับ 4 แผนปฏิบัติราชการผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	อยู่ระหว่างการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน			
	51 การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สทพ.	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ สทพ.	ระดับ 5	ระดับ 5 ผอ.สทพ. ให้ความเห็นชอบคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
	54 การดำเนินการ ประเมินความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจ ของภาครัฐ (VFM)	ต.ค.59-ก.ย.60			x		มี/ไม่มี	มี	ระดับ 3 อยู่ระหว่างการ จัดทำรายงาน VFM				
	55 การดำเนินงาน วิเคราะห์ระดับ ความสำเร็จในการใช้ จ่ายงบประมาณ (PART)	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ รายงานการ วิเคราะห์ระดับ ความสำเร็จการใช้ จ่ายงบประมาณ	ระดับ 5	ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสาร ประกอบให้กับสำนัก งบประมาณภายใน ระยะเวลากำหนด				
	56 การจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ของ สนพ.	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ของ สนพ.	ระดับ 5	ระดับ 4 รายงาน ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานแผนบริหาร ความเสี่ยงตามรอบ เวลาที่กำหนด				
	68 การจัดทำรายงาน ประจำปีของ สนพ.	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ รายงานประจำปีของ สนพ.	ระดับ 5	ระดับ 4 ดำเนินการจ้าง ที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ และจัดทำสรุปเนื้อหา รายงานประจำปีของ สนพ. เสนอต่อผู้บริหาร สนพ.	600,000			
5.4	75 การอบรม/สัมมนา ให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำ งบประมาณ	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ของการจัดสัมมนา	ระดับ 5	ระดับ 5 ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	200,000	362,961		



เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
	86 โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะหน่วย บริหารกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60				x	ระดับความสำเร็จ ในการบริหารงาน และการจัดการ เงินกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน	ระดับ 5		อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้างที่ปรึกษาฯ			คณะอนุกรรมการ กองทุนฯ เห็นชอบ ขยายระยะเวลาลง นามในสัญญาจ้างเป็น 25 ส.ค.60
5.5	89 โครงการประเมินผล โครงการภายใต้แผน กองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2559	ม.ค.60-ม.ค.61				x	ระดับความสำเร็จ ของการรายงาน สรุปผลการประเมิน โครงการฯ เสนอต่อ ผู้บริหาร สนพ.	ระดับ 5	ระดับ 2 คัดเลือก โครงการที่ได้รับการ จัดสรรเงินจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน	อยู่ระหว่างรวบรวม ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลภาคสนาม	16,580,000	1,658,000	

22,320,000

4,268,992

# ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
1.1	2 การวิเคราะห์ภาพรวม สถานการณ์พลังงาน ของโลก เปรียบเทียบ ศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้านพลังงานของไทย กับต่างประเทศ	ต.ค.59-ก.ย.60	x		x		ระดับความสำเร็จ ของการวิเคราะห์ ภาพรวม สถานการณ์ พลังงานของโลก เปรียบเทียบ ศักยภาพในการ แข่งขัน (Competitiveness ) ด้านพลังงานของ ไทยกับต่างประเทศ	ระดับ 5	อยู่ระดับ 5 ข้อมูล ภาพรวมสถานการณ์ พลังงานและภาวะ เศรษฐกิจโลกมีการ ปรับปรุง ร้อยละ 100	ดำเนินการปรับปรุง ภาพรวมสถานการณ์ พลังงานและภาวะ เศรษฐกิจโลกให้ถูกต้อง ทันสมัยเป็นประจำทุก เดือน			
	3 การวิเคราะห์และ จัดทำประมาณการ ความต้องการพลังงาน ของประเทศ	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ข้อมูลบทวิเคราะห์ และประมาณการ แนวโน้มความ ต้องการพลังงาน ของประเทศ	2 บท วิเคราะห์	มีข้อมูลบทวิเคราะห์ และประมาณการ แนวโน้มความ ต้องการพลังงานของ ประเทศ จำนวน 1 บทวิเคราะห์ (เดือน มีนาคม)				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
	7 การพัฒนาแบบจำลอง ด้านพลังงานภายใต้ ความร่วมมือพหุภาคี และทวิภาคี	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำ แบบจำลอง	ระดับ 5	ระดับ 4 นำเข้า ข้อมูลและทดสอบ แบบจำลอง				
	8 การจัดทำข้อมูล และ ประมาณการด้าน พลังงานร่วมกับสมาชิก ในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ ข้อมูล และ ประมาณการด้าน พลังงานของไทยที่ จัดทำร่วมกับ สมาชิกในประเทศ อาเซียน	ระดับ 5	ระดับ 3 ส่งข้อมูลให้ IEA ได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน จำนวน 8 ครั้ง	500,000	80,000		
4.1	36 การเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศด้าน พลังงานของประเทศ	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ร้อยละการจัดทำ ข้อมูลพลังงานแล้ว เสร็จในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ 100	ระดับ 3 เผยแพร่ ข้อมูล 8 ครั้ง				
	37 การจัดทำรายงานการ ปล่อยก๊าซเรือน กระจกที่มีผลกระทบต่อ ความต้องการใช้ พลังงานรายสาขา เศรษฐกิจ	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ รายงานการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกที่ มีผลกระทบต่อ ความต้องการใช้ พลังงานรายสาขา เศรษฐกิจ	ระดับ 5	ระดับ 4 ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการ ทดลอง				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ได้รับ		ใช้จริง
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
	38 การจัดทำหนังสือ รายงานสถิติข้อมูล พลังงานของประเท ไทย	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ หนังสือรายงาน สถิติข้อมูลพลังงาน ของประเทศไทย	ระดับ 5	ระดับ 3 ออกแบบ ตาราง กราฟ		540,000		
4.2	39 การทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สนพ. ให้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการทบทวน และจัดทำ แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของ สนพ. ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	ระดับ 5	ระดับ 3 ทบทวนและ วิเคราะห์แผนแม่บทฯ ปี 2557 - 2561 ของ สนพ. ให้ สอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวง DE				
	40 การจัดเตรียมความ พร้อมเพื่อการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลพลังงาน ของประเทศ	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดเตรียม ความพร้อมเพื่อ การจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลพลังงานของ ประเทศ	ระดับ 5	ระดับ 3 ออกแบบใน การจัดทำต้นแบบ สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ข้อมูลพลังงานของ ประเทศไทย				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ได้รับ		ใช้จริง
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
41	การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อการพัฒนา ICT ในองค์กร	ระดับ 5 บุคลากร สนพ. พึงพอใจต่อการพัฒนา ICT ในองค์กร ร้อยละ 80 - 100					
42	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทน ระยะที่ 1 (ต่อเนื่องปี 2559)	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทน ระยะที่ 1	ระดับ 5 การติดตั้งระบบงานสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่เดิมได้สมบูรณ์		2,000,000	2,000,000		
43	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ (ต่อเนื่องปี 2559)	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ	ระดับ 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ Web Base Application พร้อมทั้งสามารถให้บริการบนเครือข่าย Intranet และรองรับการให้บริการเครือข่าย Internet ของ สนพ. ได้ในอนาคต	อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลแก่ผู้รับผิดชอบ	2,000,000	1,400,000		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
	44 โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อ สนับสนุนการจัดทำค่า พยากรณ์ไฟฟ้า (Load Forecast) รายภาค	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของโครงการ พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการ จัดทำค่าพยากรณ์ ไฟฟ้า (Load Forecast) รายภาค	ระดับ 5	ระดับ 3 พัฒนา ระบบฐานข้อมูลใน รูปแบบ Web Base Application พร้อม ทั้งสามารถให้บริการ บนเครือข่าย Intranet และ รองรับการให้บริการ เครือข่ายInternet ของ สทพ. ได้ใน		5,000,000	2,500,000	
	45 การปรับปรุง/พัฒนา/ ดูแลระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย ตลอดจน อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ของการปรับปรุง/ พัฒนา/ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆให้สามารถใช้ งานได้ตลอดเวลา	ระดับ 5	อยู่ระดับ 5 ระบบ คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้รับการปรับปรุง/ พัฒนา/ดูแลอย่าง ครบถ้วน ร้อยละ 100		2,200,000	2,200,000	
	46 การจัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของ สทพ.	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ของการจัดหา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ระดับ 5	ระดับ 5 ติดตั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรใน สทพ.		400,000	400,000	
5.4	71 การจัดการความรู้ใน องค์กร (EPPO KM)	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดการ ความรู้ในองค์กร (EPPO KM)	ระดับ 5	ระดับ 3 ในวันที่ 30 มิ.ย.60 โดย Bloomberg New Finance ได้นำเสนอ รายงาน Energy Outlook 2017				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ได้รับ		ใช้จริง
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
	76 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร	ระดับ 5	ระดับ 4 มีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรและคณะทำงานในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ระเบียบเศรษฐกิจ (EEC) เป็นต้น		160,000		

12,800,000 8,580,000



# สำนักนโยบายไฟฟ้า

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน

สำนักนโยบายไฟฟ้า

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
1.1	4 การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมการรับซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	ระดับ 5	ระดับ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือการค้าขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22 มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน		70,000	51,700	
	5 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	ต.ค.59-ก.ย.60				x	ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาแผนการเชื่อมโยงและแนวทางการดำเนินกิจกรรมการค้าขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน	ระดับ 5			60,000		
	6 การเสนอแนะนโยบายศึกษา ติดตามและพิจารณาการรับซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จในการพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศเพื่อนบ้าน	ระดับ 5	ระดับ 5 กพช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ Trariff MOU โครงการในประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย 1 โครงการ				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
1.2	10 การขยายระบบ โครงข่าย และ แผนการลงทุนใน กิจการไฟฟ้า	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการขยายระบบ โครงข่าย และ แผนการลงทุนใน กิจการไฟฟ้า	ร้อยละ 70	ระดับ 3 การขยายโครงข่าย ไฟฟ้าและการลงทุนในกิจการ ไฟฟ้าเป็นไปตามแผน ร้อยละ 50				
	11 โครงการศึกษา นโยบายซื้อขายไฟฟ้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมใน บริเวณชายแดนเพื่อ รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2	มี.ค.60-มี.ค.61			x		ระดับความสำเร็จ ของการศึกษา นโยบายซื้อขาย ไฟฟ้าเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมใน บริเวณชายแดนเพื่อ รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2	ระดับ 5	ระดับ 2 ที่ปรึกษาส่งมอบ รายงานสรุปแนวทาง การศึกษาเบื้องต้น	6,900,000	1,725,000	ล่าช้ากว่า กำหนด เนื่องจากเปิด ยื่นข้อเสนอ 2 ครั้ง โดยครั้ง แรกไม่มีผู้ใดยื่น ข้อเสนอ	
1.4	15 โครงการสื่อสารและ สร้างภาพลักษณ์ต่อ นโยบายการจัดหา ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2559)	ธ.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ในการจัดโครงการ สื่อสารและสร้าง ภาพลักษณ์ต่อ นโยบายการจัดหา ไฟฟ้า	ระดับ 5	ระดับ 3 จัดทำการสำรวจ ข้อมูลความเห็นของภาคปะร ชาชนในพื้นที่เป้าหมาย	3,547,000	3,192,300		
	16 โครงการแผนงาน สื่อสารการจัดทำ แผนพัฒนากำลังการ ผลิตไฟฟ้าของประเทศ ไทย	ก.ย.59-มี.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำ โครงการแผนงาน สื่อสารการจัดทำ แผนพัฒนากำลัง การผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทย	ระดับ 5	ระดับ 4 สำรวจความเห็น ของประชาชนในภูมิภาคต่อ ประเด็นการจัดทำแผน PDP โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2,400 ตัวอย่าง	6,370,000	3,819,900		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
2.2	25 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทบทวนต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ร้อยละความสำเร็จของโครงการสนับสนุนการดำเนินงานทบทวนต้นทุนราคารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff	ร้อยละ 100	ร้อยละ 80 ส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 2 ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การทบทวนข้อมูลด้านวิชาการ และแนวโน้มนโยบายในต่างประเทศ จัดศึกษาดูงานภายในประเทศ 3 ครั้ง		4,500,000	3,987,000	
5.4	78 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า	ยกเลิก					ระดับความสำเร็จของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนรองรับสภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า	ระดับ 5			160,000		ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ผอ. สนพ. มีนโยบายให้นำงบประมาณดังกล่าวไปจัดร่วมกับโครงการอบรมอื่น
	79 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดหาพลังงานไฟฟ้า	ยกเลิก					จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา	250 คน			580,000		ยกเลิกโครงการเนื่องจาก ผอ. สนพ. มีนโยบายให้นำงบประมาณดังกล่าวไปจัดร่วมกับโครงการอบรมอื่น

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงาน ความก้าวหน้า (กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
80	การอบรม/สัมมนาให้ ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องโครงการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน	ต.ค.59-ก.ย.60		x			จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา	42 คน	ระดับ 4 จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนาไม่น้อยกว่า 40 คน (เข้าร่วม 41 คน)		212,649	185,649	

22,399,649      12,961,549

# สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  
สำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
1.1	1 การทบทวนและ จัดทำแผนโครงสร้าง พื้นฐานก๊าซธรรมชาติ	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำแผน โครงสร้างพื้นฐาน ก๊าซธรรมชาติ	ระดับ 5	ระดับ 5 นำเสนอ กพข. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559				
1.3	12 โครงการศึกษาการ ปรับปรุงโครงสร้าง ราคา ณ โรงกลั่น น้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อเนื่องปี 2559)	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการศึกษา การปรับปรุง โครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นน้ำมัน เชื้อเพลิง	ระดับ 5	ระดับ 4 ส่งรายงาน ฉบับสุดท้าย (Final report)	6,800,000			
	13 การจัดทำแนว ทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการ โครงสร้างก๊าซ ธรรมชาติ	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ แนวทางการ ส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการ โครงสร้างก๊าซ ธรรมชาติ	ระดับ 5	ระดับ 4 นำร่างแนว ทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติเสนอ กบง.				
	14 การจัดทำร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ....	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำร่าง พระราชบัญญัติ กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ....	ระดับ 5	ระดับ 3 เสนอ RIA ต่อคณะกรรมการ กฤษฎีกา				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ได้รับ		ใช้จริง
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
2.2	26 การปรับโครงสร้าง ราคาพลังงานทดแทน : ไบโอดีเซล (B100)	ต.ค.58-ก.ย.59			x		ระดับความสำเร็จ ของการปรับ โครงสร้างราคา พลังงานทดแทน : ไบโอดีเซล (B100)	ระดับ 5	ระดับ 4 นำร่าง หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา B100 เสนอ กบง.				
5.4	77 การอบรม/สัมมนาให้ ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ	ต.ค.59-ก.ย.60	x				ระดับความสำเร็จ ของการอบรม/ สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการส่งเสริม การแข่งขันใน กิจการก๊าซ ธรรมชาติ	ระดับ 5	ระดับ 5 ร้อยละ 80	130,000	193,760		

6,930,000      193,760



สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ  
พลังงานทดแทน

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  
สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
2.1	19 โครงการสนับสนุนการ ศึกษาวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของโครงการ สนับสนุนการ ศึกษาวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทน	ระดับ 5	ระดับ 3 รวบรวม ความเห็นและ ข้อเสนอแนะจาก ผู้เชี่ยวชาญแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างจัดเตรียม วาระเสนอ คณะอนุกรรมการ กองทุนฯ	500,000,000		
	20 โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาด้าน พลังงานทดแทน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการดำเนิน โครงการสนับสนุน การศึกษาด้าน พลังงานทดแทน	ระดับ 5	ระดับ 2 สรุปผลการเสนอ ขอรับทุนจากหน่วยงานที่ ยื่นสมัคร	อยู่ระหว่างรอผลการ พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ	17,930,000		
	21 โครงการสนับสนุนทุน วิจัยแก่นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้าน พลังงานทดแทน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการดำเนิน โครงการสนับสนุน ทุนวิจัยแก่นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ด้านพลังงาน ทดแทน	ระดับ 5	ระดับ 4 อนุมัติและแจ้งผล การพิจารณาให้หน่วยงาน ที่สมัครขอรับทุนทราบ จำนวน 52 ทุน	อยู่ระหว่างทำหนังสือ ยืนยัน	7,000,000	5,226,800	
	22 โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้าน พลังงานทดแทน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของการดำเนิน โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านพลังงาน ทดแทน	ระดับ 5	ระดับ 5 ทำสัญญา/ หนังสือยืนยันการรับทุน กับหน่วยงานต้นสังกัดของ ผู้ได้รับทุนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย.60		3,000,000	644,131	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
2.2	23 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)	ต.ค.59-ก.ย.61			x		จำนวนรถตุ๊กตุ๊กที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า	100 คัน		อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประกาศรับผู้เข้าร่วมโครงการ	69,938,000		
	24 โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ระยะที่ 2	ต.ค.59-ก.ย.61			x		จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร่งด่วน	50 สถานี		อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการในเดือน ก.ค.60	20,500,000		
3.1	27 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของโครงการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 3 รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างจัดเตรียมวาระเสนอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ	300,000,000		
	28 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 2 สรุปผลการเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานที่ยื่นสมัคร	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ	17,930,000		
	29 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 4 อนุมัติและแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่สมัครขอรับทุนทราบจำนวน 25ทุน	อยู่ระหว่างทำหนังสือยืนยัน	6,000,000	1,626,369	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
30	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้าน อนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.59-ก.ย.60			x		ระดับความสำเร็จ ของโครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้าน อนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 5 ทำสัญญา/ หนังสือยืนยันการรับทุน กับหน่วยงานต้นสังกัดของ ผู้ได้รับทุนให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย.60		3,000,000	651,983	
31	โครงการ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ประหยัดพลังงานภาค ประชาชน	ก.พ.60-ก.พ.61			x		การผลิตและ เผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประหยัด พลังงานภาค ประชาชนผ่านสื่อ ดิจิทัล	900,000 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ โดยมีการ จัดทำคลิป ประชาสัมพันธ์แล้ว 1 คลิป(เรื่อง ฤดูหนาว 2) จากทั้งหมด 3 คลิป และอยู่ระหว่างการ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์		39,400,000		
32	โครงการผลิตและ เผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน	ม.ค.60-ม.ค.61			x		ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อต่างๆ	22 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ		24,550,000		
33	โครงการ ประชาสัมพันธ์ผลงาน กองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน ครบรอบ 25 ปี	ม.ค.60-ม.ค.61			x		จัดกิจกรรมแสดง ภารกิจ ผลงานและ โครงการเด่นที่ กองทุนเพื่อ ส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงานให้ การสนับสนุน	6 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ โดยแสดง ผลงานแล้ว 1 ครั้ง คือ งาน ASEAN Sustainable Energy week2017		23,950,000		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานตาม เป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
	34 โครงการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน	ก.พ.60-ก.พ.61			x		ระดับความสำเร็จ ของโครงการ ติดตามและ ประเมินผล โครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อ ส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 1 เสนอกรอบ ศึกษาวิจัย	5,600,000	1,120,000		
	35 โครงการลดการใช้ พลังงานในภาครัฐ	ต.ค.59-ธ.ค.60			x		ระดับความสำเร็จ ของโครงการลด การใช้พลังงานใน ภาครัฐ	ระดับ 5	อยู่ระหว่างรวบรวม ข้อมูลที่หน่วยงาน ราชการต่างๆ ได้รายงาน เข้ามาในระบบผ่านเว็บ ไซด์และแอปพลิเคชัน e-report โดยสามารถ รายงานผลการ ดำเนินงานได้ในเดือน พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากต้องรอให้ หน่วยงานต่างๆ ได้ รายงานผลการใช้ พลังงานตลอดทั้ง ปีงบประมาณ 2560	58,100,000	56,682,000		

1,096,898,000 65,951,283

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ผชช.วย.)

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  
 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ผชช.วย.)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย	รายงานความก้าวหน้า (กรณีอยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	งบประมาณ		ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
			ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					ที่ได้รับ	ใช้จริง	
			บรรลุ	ไม่บรรลุ									
5.5	87 โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ศ.60-พ.ศ.61				x	ระดับความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 1 จัดทำบัญชีและรายงานการเงินส่ง สตง. ตรวจสอบ 4 ครั้ง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	9,025,236	730,810	
	88 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ม.ค.60-พ.ย.60			x		ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5	ระดับ 4 จัดทำแผนการปรับปรุงการให้บริการและติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง	อยู่ระหว่างการดำเนินงานและติดตามงานตามแผนการปรับปรุงความพึงพอใจ	4,900,000	2,450,000	

13,925,236 3,180,810

ภาคผนวก



แผนปฏิบัติงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2560	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					เจ้าภาพ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบาย และบริหารแผนด้านพลังงานของประเทศ</b>											
1.1 มีนโยบายและแผนพลังงานที่ยึดหลักความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงานกับการจัดหาพลังงาน	- ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการด้านการจัดการการใช้พลังงานได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณา นโยบาย	90	1.1.1 จัดทำแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	1 การทบทวนและจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	สปป.	
				2 การวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์พลังงานของโลก เปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness) ด้านพลังงานของไทยกับต่างประเทศ	-	-	-	-	-	ศพส.	
				3 การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	-	ศพส.	
			1.1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ	4 การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	0.07	-	-	-	-	-	สนฟ.
				5 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	0.06	-	-	-	-	-	สนฟ.
				6 การเสนอแนะนโยบาย ศึกษา ติดตามและพิจารณาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	-	-	-	-	-	-	สนฟ.
				7 การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	-	-	-	-	-	-	ศพส.
				8 การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	0.50	-	-	-	-	-	ศพส.
				9 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	0.47	-	-	-	-	-	กนย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2560	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
1.2 ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	- อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP (Energy Elasticity of GDP)	0.6	1.2.1 จัดทำแผนความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งข้อเสนอมาตรการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ	10 การขยายระบบโครงข่าย และแผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า	-	-	-	-	-	สนฟ.
				11 โครงการศึกษาขยายซื้อขายไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 2	7.00	-	-	-	-	สนฟ.
1.3 มีนโยบายและมาตรการราคาพลังงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์	- ร้อยละของจำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการราคาพลังงานได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย	90	1.3.1 เสนอแนะนโยบาย และส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้สะท้อนราคาที่เป็นธรรม	12 โครงการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง (ต่อเนื่องปี 2559)	-	6.80	-	-	-	สปป.
				13 การจัดทำแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโครงสร้างก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	สปป.
				14 การจัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	สปป.
1.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และแผนการบริหารพลังงาน เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการพลังงาน	- ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และแผนบริหารพลังงาน	5	1.4.1 สร้างความรู้ความเข้าใจด้านนโยบายและแผนพลังงาน	15 โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อนโยบายการจัดการไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2559)	3.55	-	-	-	-	สนฟ.
				16 โครงการแผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	6.37	-	-	-	-	สนฟ.
				1.4.2 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบาย/แผนพลังงาน						
1.5 มีระบบการกำกับติดตามนโยบายและแผนบริหารพลังงานที่มีประสิทธิภาพ	- ร้อยละของนโยบาย/มาตรการที่ถูกขยายผลในการนำไปปฏิบัติ	80	1.5.1 ปรับปรุงการกำกับ ดูแล การติดตาม และประเมินผลด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ	17 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านนโยบายพลังงาน	-	-	-	-	-	กนย.
				18 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการที่อนุมัติโดย กพข.	4.47	-	-	-	-	กนย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2560	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					เจ้าภาพ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด</b>											
2.1 มีข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน ทดแทนและพลังงานสะอาด	- ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงาน ทดแทนและพลังงานสะอาดได้รับการ ยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย	65	2.1.1 กำหนดทิศทางส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาพลังงาน ทดแทนและสนับสนุนการลงทุน วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/ต้นแบบ การผลิตพลังงาน	19 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี พลังงานทดแทน	-	-	300.00	-	-	สนอ.	
				20 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	-	-	17.93	-	-	สนอ.	
				21 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	-	-	7.00	-	-	สนอ.	
				22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน	-	-	3.00	-	-	สนอ.	
2.2 มีการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน NGV  - สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน	0.5	2.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาด	23 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)	-	-	69.94	-	-	สนอ.	
				24 โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charing Station) ระยะที่ 2	-	-	34.94	-	-	สนอ.	
		12.4	2.2.2 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้ราคาตลาดจุดใจผู้ใช้และผู้จำหน่าย	25 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทบทวนต้นทุนราคาไฟฟ้าในรูปแบบ Feed in Tariff	4.50	-	-	-	-	สนพ.	
				26 การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทดแทน	-	-	-	-	-	สปป.	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ</b>											
3.1 เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในทุกภาคส่วน	- ระดับความสำเร็จของการรณรงค์การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงานให้เป็นวินัยของคนในชาติ	5	3.1.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม อาคาร คริวเรือน และภาคขนส่ง	27 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	-	-	500.00	-	-	สนอ.	
				28 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	-	-	17.93	-	-	สนอ.	
				29 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน	-	-	6.00	-	-	สนอ.	
				30 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน	-	-	3.00	-	-	สนอ.	
			3.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัดลดจนการอนุรักษ์พลังงานกับการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	31 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	-	-	40.00	-	-	-	สนอ.
				32 โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	33.20	-	-	-	สนอ.
				33 โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครบรอบ 25 ปี	-	-	27.50	-	-	-	สนอ.
				34 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	6.00	-	-	-	สนอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2560	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
				35 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ	-	-	58.10	-	-	สนอ.
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ</b>										
4.1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ครบถ้วนถูกต้อง แม่นยำ ทันสถานการณ์ และเชื่อถือได้	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ  - จำนวนบทความ/บทวิเคราะห์ด้านพลังงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปีงบประมาณ (ผ่านเว็บไซต์)	86	4.1.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และความถูกต้องของระบบสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	36 การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	-	ศพส.
		12		37 การจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงานรายสาขาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	ศพส.
				38 การจัดทำหนังสือรายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	0.70	-	-	-	-	-
4.2 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านพลังงาน	- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อการพัฒนา ICT ในองค์กร	80	4.2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารระบบสารสนเทศด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ	39 การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	-	-	ศพส.
				40 การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	-	-	-	-	-	ศพส.
				41 การศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	ศพส.
			4.2.2 สำรวจ และจัดทำโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่สามารถทำงานร่วมกับระบบต่างๆ ได้	42 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทน ระยะที่ 1 (ต่อเนื่องปี 2559)	-	-	2.00	-	-	ศพส.
		43 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ (ต่อเนื่องปี 2559)		-	2.00	-	-	-	ศพส.	
		44 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทำค่าพยากรณ์ไฟฟ้า (Load Forecast) รายภาค		-	-	5.00	-	-	ศพส.	
		45 การปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ		2.20	-	-	-	-	ศพส.	
		46 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ สนพ.		0.40	-	-	-	-	ศพส.	



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2560	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					เจ้าภาพ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ภายนอก)</li> <li>- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในหน่วยงาน</li> <li>- ร้อยละของการรับรู้ของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับรู้ถึงบทบาทและผลการดำเนินงานของ สนพ.</li> </ul>	85		56 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สนพ.	-	-	-	-	-	กนย.	
		90		57 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในด้วยตนเอง	-	-	-	-	-	ตส.	
				58 โครงการส่งเสริมการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชันและปราบปรามและความโปร่งใสของ สนพ.	0.02	-	-	-	-	สบก.	
				59 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	0.47	-	-	-	-	สบก.	
				60 การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.11	-	-	-	-	สบก.	
				61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	0.09	-	-	-	สบก.
				62 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	-	-	-	-	-	-	สบก.
				63 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	-	-	-	-	-	-	สบก.
		85		64 การพัฒนาระบบตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	สบก.	
		5.2.4 พัฒนางานบริการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยยึดหลักความรวดเร็ว มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ		65 โครงการสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สนพ.	-	-	-	-	-	-	สบก.
				66 โครงการวางแผนและออกแบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	5.00	-	-	-	สบก.
		5.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การดำเนินงานของ สนพ. ไปสู่สาธารณชน		67 โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารนโยบายพลังงาน	-	-	3.20	-	-	-	สบก.
				68 การจัดทำรายงานประจำปีของ สนพ.	0.60	-	-	-	-	-	กนย.
5.3 มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>- ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล</li> </ul>	70	5.3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนพ.	69 โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	-	-	-	-	-	สบก.	
		80		70 การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)	-	-	-	-	-	สบก.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2560	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					เจ้าภาพ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
5.4 มีทรัพยากรบุคคลที่มี สมรรถนะสูง	- ระดับคะแนนขีดสมรรถนะของ บุคลากร สนพ. Core Competency	3.75	5.4.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน องค์กรให้มีความเหมาะสมกับ ภารกิจงานที่ปฏิบัติ	71 การจัดการความรู้ในองค์กร	-	-	-	-	-	ศพส.	
				72 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.05	-	-	-	-	สบก.	
				73 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร "English Training Course 2016"	0.27	-	-	-	-	สบก.	
	- ระดับคะแนนขีดสมรรถนะของ บุคลากร สนพ. Functional Competency	4	5		74 การฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายเฉพาะด้าน	0.28	-	-	-	-	สบก.
					75 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ งบประมาณ	0.40	-	-	-	-	กนย.
	- ระดับความสำเร็จของการจัดการ ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สนพ.	5	5		76 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	0.16	-	-	-	-	ศพส.
					77 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริม การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	0.42	-	-	-	-	สปป.
					78 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแผนรองรับ สภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า	0.16	-	-	-	-	สนฟ.
					79 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดหา พลังงานไฟฟ้า	0.58	-	-	-	-	สนฟ.
					80 การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และ มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	0.25	-	-	-	-	สนฟ.
					81 การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ						
					82 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ	0.01	-	-	-	-	สบก.
					83 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	0.03	-	-	-	-	สบก.
84 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย	0.02	-	-	-	-	สบก.					
			5.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม								

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2560	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
5.5 มีระบบการบริหารกองทุน พลังงานที่โปร่งใส และมี	- ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจาก เงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเงินกองทุน  - ร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับ ทุนอุดหนุนทั้ง 3 กองทุนที่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ	80	5.5.1 กำหนดยุทธศาสตร์การ บริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน สนับสนุน	85 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุน จากสัญญาโรงกลั่นปีโตรเลียม	-	-	-	0.64	-	สบก.
		65		86 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะหน่วยบริหารกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	8.85	-	-	กนย.
		5.5.2 พัฒนาระบบการใช้จ่าย เงินกองทุนและระบบการกำกับ ดูแลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนให้มี ประสิทธิภาพ	87 โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	9.25	-	-	-	ผชช.วย.
			88 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน	-	-	4.94	-	-	-	ผชช.วย.
			89 โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	16.60	-	-	-	กนย.
			90 การปิดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรร เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	-	-	สบก.
			91 การควบคุม กำกับดูแล บริหารงบประมาณ การเงิน การ บัญชี และการพัสดุของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรง กลั่นปีโตรเลียม	-	-	-	-	-	-	สบก.
		5.5.3 พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล สารสนเทศด้านเงินกองทุน และ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง								
					34.12	8.80	1,179.47	0.64	-	1,223.03
